

万松路商城大道至虹桥北路段7月14日至7月29日禁止车辆通行

道路全封闭施工 提前45天通车


■记者 潘虹

日前,安阳中心城区与瑞安交警联合发布通告,因万松路(商城大道至虹桥北路段)道路改造工程需要,7月14日至7月29日,对施工路段实施交通限制,禁止车辆通行(除急救车、消防车、运钞车、施工车等特殊车辆外)。

从最初的半幅封道施工,到万松路周松路口至虹桥北路段封道施工,再延伸至万松路商城大道至虹桥北路段封闭施工,万松路(瑞祥大道至虹桥北路段)整治提升工程究竟有何困难?为何总要封道施工?为此,记者采访了安阳中心城区相关负责人,对市民关注的热点问题进行了了解。



封道路段示意图

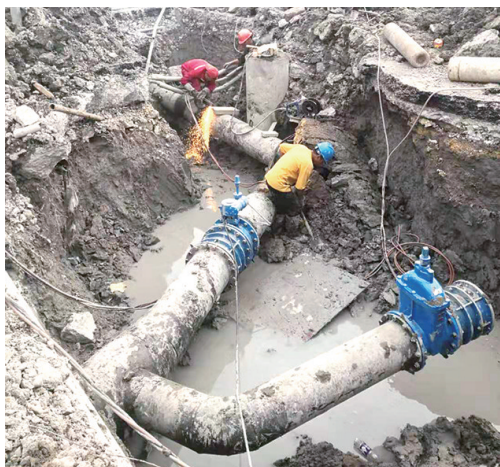

现场施工

此次封道施工,是什么原因?

答:主要是为了提前工期,及早开放商城大道至虹桥北路通行,方便市民出行。万松路周松路至虹桥北路段整治提升期间,虽然我们与有关部门多次调研制定各种疏导方案,但还是对市民出行造成影响。封闭施工其实是自我加压,封道施工期间,施工队将加班加点,尽快恢复万松路商城大道至虹桥北路段双向六车道通行,通车时间比原计划提前45天,缓解市民出行拥堵问题。

目前该路段施工进度如何?

答:项目自开工以来,在相关部门和街道的支持配合下,我们克服了天气、交通和施工中的各种困难,目前,万松路商城大道至虹桥北路段已经完成给排水管道和排水排污管道安装施工的80%(道路交叉口及过

街部分管线未完成),主车道原路面铣刨基本完成。

封道施工期间,该路段将完成哪些施工项目?

答:封道后,我们将和有关部门集中“火力”进行施工,完成沥青基(面)层、标志标线、行道树(乔木)、路灯以及商城大道虹桥北路两大交叉口沥青铺装等各项工作,一标段、二标段(商城大道至虹桥北路段)确保7月底开放通车,比原通车计划提前45天。人行道与部分绿化工程会持续进行,后续完工。三标段(商城大道至瑞祥大道段)仍按双向二车道通行,改造工程下步也打算提速。

如果此次不封闭施工,是否可以一直保持双向两车道通行?

答:不行。7月14日,该路段开始铺

设基层沥青,需要封道4天,然后还需要两天设置护栏,7月20日才可以开放双向两车道通行,但是在施工区域行车有安全隐患。7月25日,商城大道与虹桥北路两大交叉口施工又需要封道2天,沥青面层施工时还需封道4天,反复开通和封道也会给市民出行带来许多不便。

封闭施工结束后,万松路人民医院周边交通会不会基本恢复正常?

答:是的。6月18日,我们进行人民医院过街天桥桩基础建设,对万松路周松路至虹桥北路段进行封闭施工,虽然周边预留了“生命通道”,但多少会对市民就医造成麻烦。目前,过街天桥桩基础施工已经完成,还要进行桩基检测和浇筑桩基础承台,封道施工结束后,这些基础工程也会一并完工,周边交通将恢复正常,市民就医的交通问题将基本解决。另外,在封道期

间,救护车等应急车辆,在安全人员的带领下,允许临时按照安全路线通行。

万松路(瑞祥大道至虹桥北路)整治提升工程施工中遇到有哪些难点与困难?

答:首先就是天气。雨一直下,可以说是“泡”在雨水里施工,这不仅对施工进度带来很大影响,也对安全生产带来难度;其次是地下管线比预想复杂。万松路自建成后,20余年未进行整修,地下管线错综复杂,整修过程中出现许多前期无法预估的难题,边研究边施工追赶进度;再次是一直有新项目追加。为了不造成道路二次开挖,在开工后,6月新增人民医

院过街天桥桩基础建设和5G管线铺设两项工程。7月又新增“五水共治”项目(松涌河治理),要从商城大道至周松路查找21座以前路面改造时被封压的雨水主管检查井,这些检查井位于临时行车道中间,深度又在现状路面1米以下,需凿除现有路面板块、稳定层及矿渣层,再行修复。查找修复期间不利于车辆安全通行,而如果此次不查找修复,下次查找会造成道路的二次开挖,这也是此次封道施工的原因之一。



时代楷模

李保国

我的事业才算成功  
父老乡亲都富起来

富强

李保国生前是河北农业大学教授、博士生导师。他长期奋战在扶贫攻坚和科技创新第一线,把毕生精力投入到山区生态建设和科技富民事业之中,让140万亩荒山披绿,带领10万农民脱贫致富,赢得山区人民的爱戴。

时代楷模公益广告

时代楷模

廖俊波

我们工作的分数应该由老百姓去打

民主

廖俊波生前是福建省南平市委常委、南平副市长、武夷新区党工委书记。他牢记党的嘱托,团结带领干部群众苦干实干,真心真意为人民造福,以实际行动体现了对党忠诚、心系群众、忘我工作、无私奉献的优秀品质,以良好的形象和口碑赢得了党员、干部和群众的广泛赞誉,是新时代县委书记的好榜样。

时代楷模公益广告
